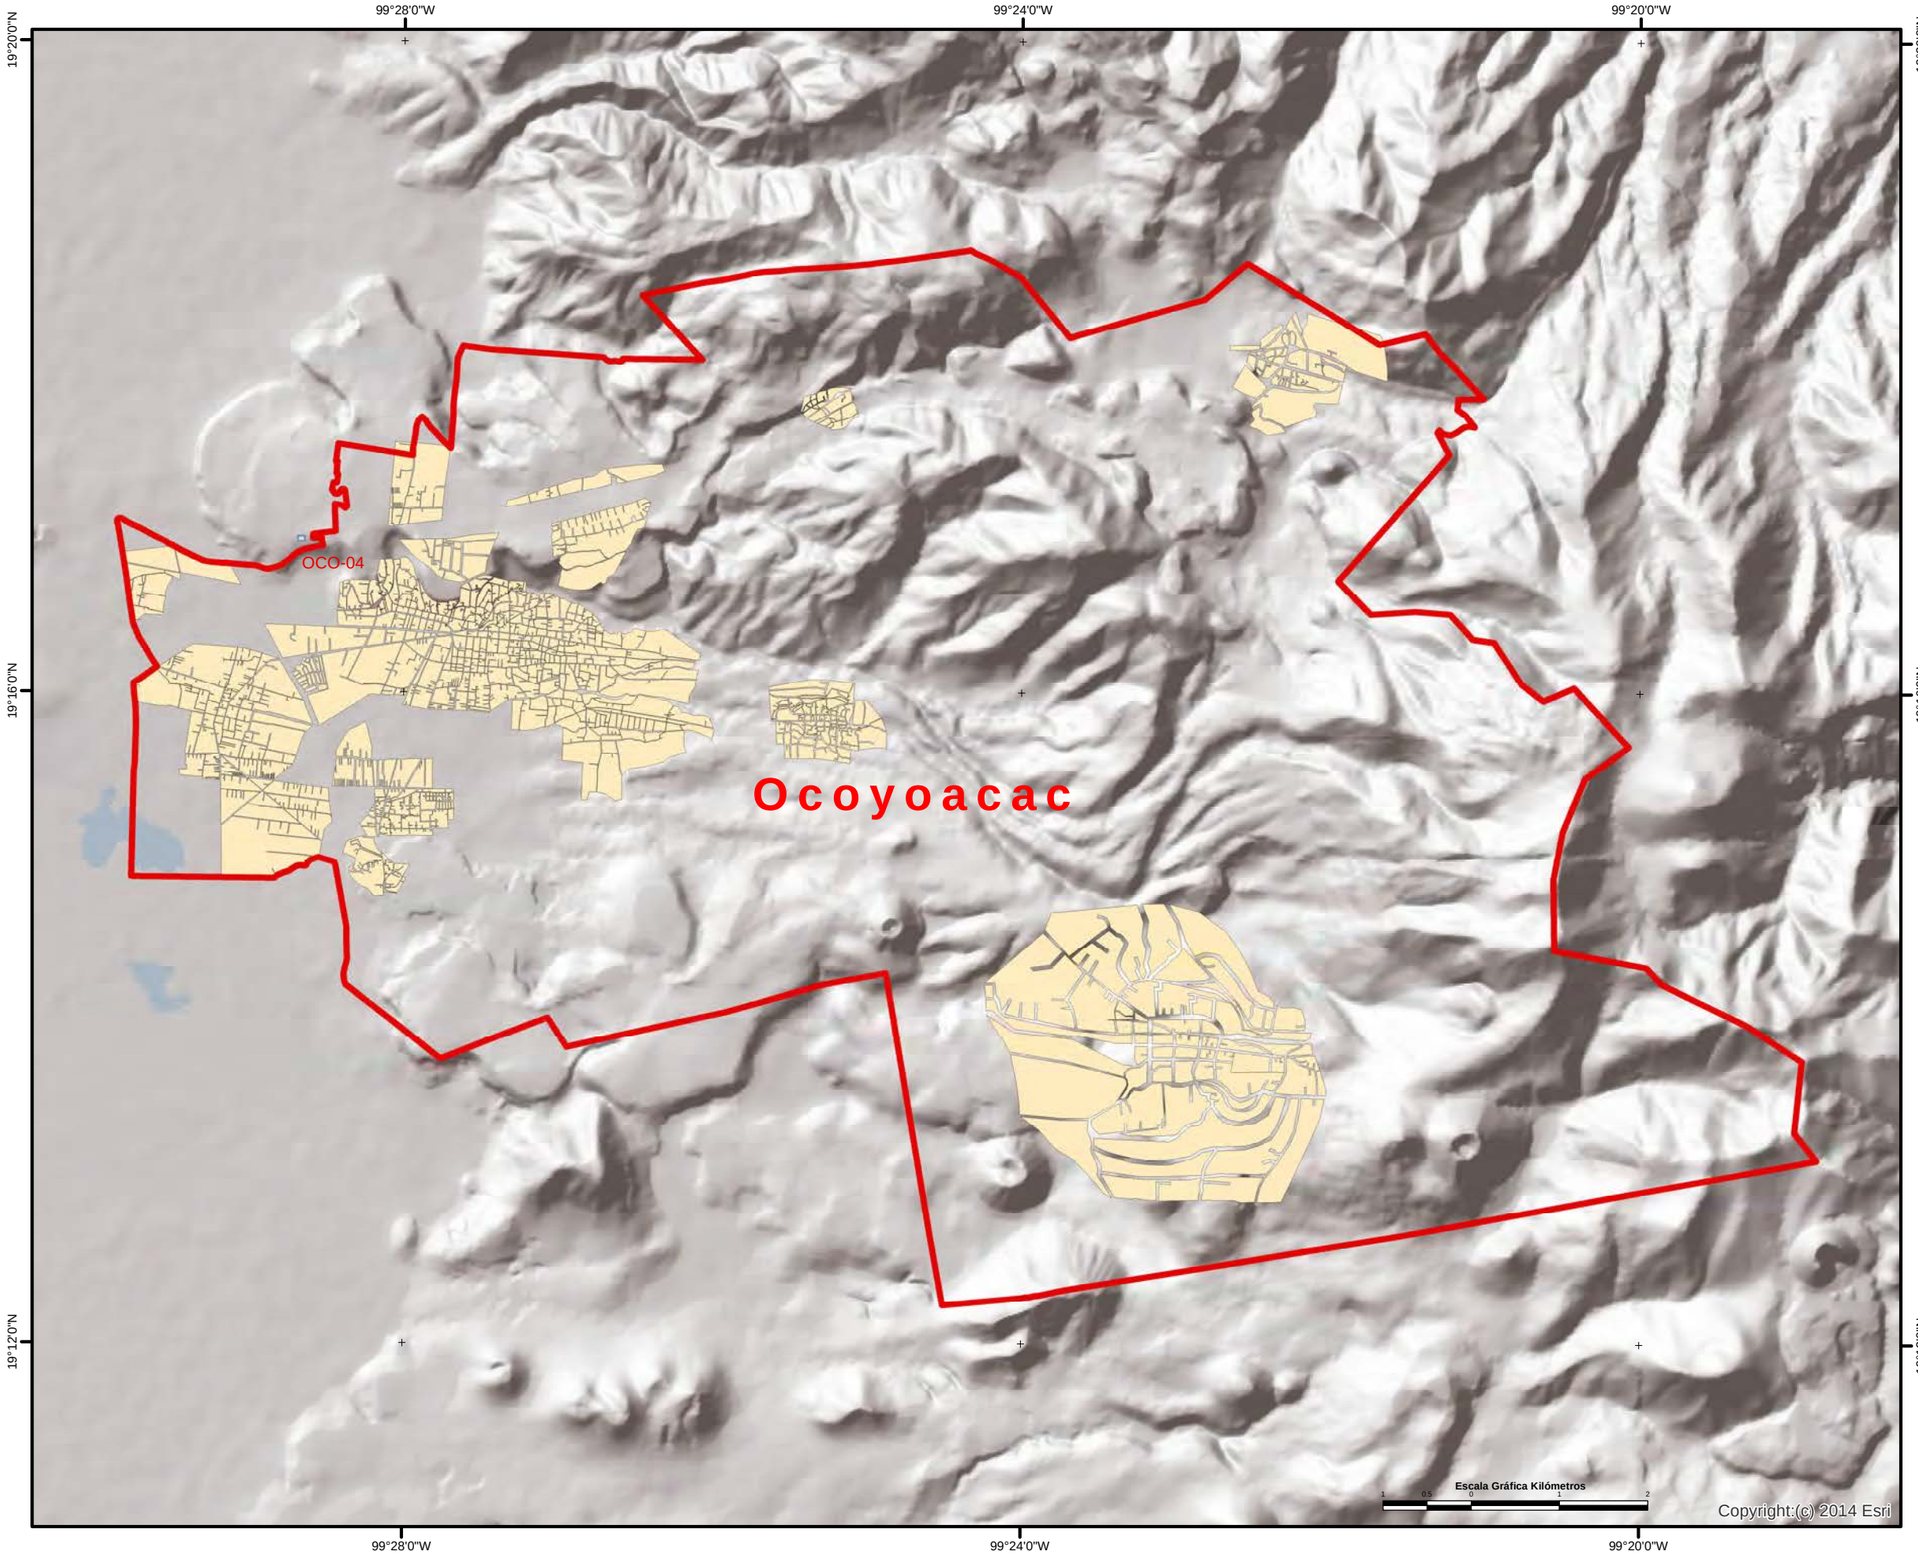

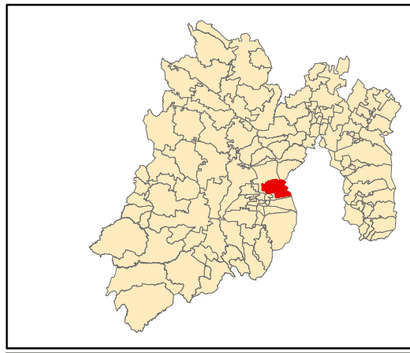

S I M B O L O G Í A

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- Río Perenne
- Río Intermitente
- FFCC
- Presas y Bordos
- Inun. Urb. Fluvial
- Inun. Urb. Pluvial
- Inun. Rural Fluvial
- Inun. Rural Pluvial
- Ench. Fluvial
- Ench. Pluvial
- Granizada
- Deslave de Tierra
- Tromba

Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m^2)
OCO-04	Ench. Pluvial	0	4,621
Totales	**1**	**0**	**4,621**

Atlas de Inundaciones No. XXVI
Temporada de lluvias 2019
Cuenca del Río Lerma

Municipio

Ocoyoacac

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

caem

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Cuenca: Río Lerma
Municipio: Ocoyoacac
Gerencia regional de la CAEM: Toluca
Clave del sitio: OCO-04
Temporada de lluvias: 2019

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Ocoyoacac.

Colonia(s) y/o barrio(s): Fraccionamiento Los Encinos.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Autopista Toluca - México.

Al sur: Autopista Toluca - México.

Al oriente: Acceso al Fraccionamiento Los Encinos.

Al poniente: Fonda Yecapixtla.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 años (Baja).

II. Vulnerabilidad

Superficie (m²): 4,621

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): 18 de junio de 2019.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.60
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria y falta de mantenimiento.

Descripción: La precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de mantenimiento, provocaron encharcamientos en el retorno de la Autopista Toluca - México con tirantes de hasta 60 centímetros.

IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de la CAEM, realizó la limpieza y desazolve de la red de drenaje, utilizando un equipo de presión - succión y 1 equipo especializado.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM

V. Obras y acciones contempladas para el año 2020

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje de la autopista.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAPUFE y H. Ayuntamiento

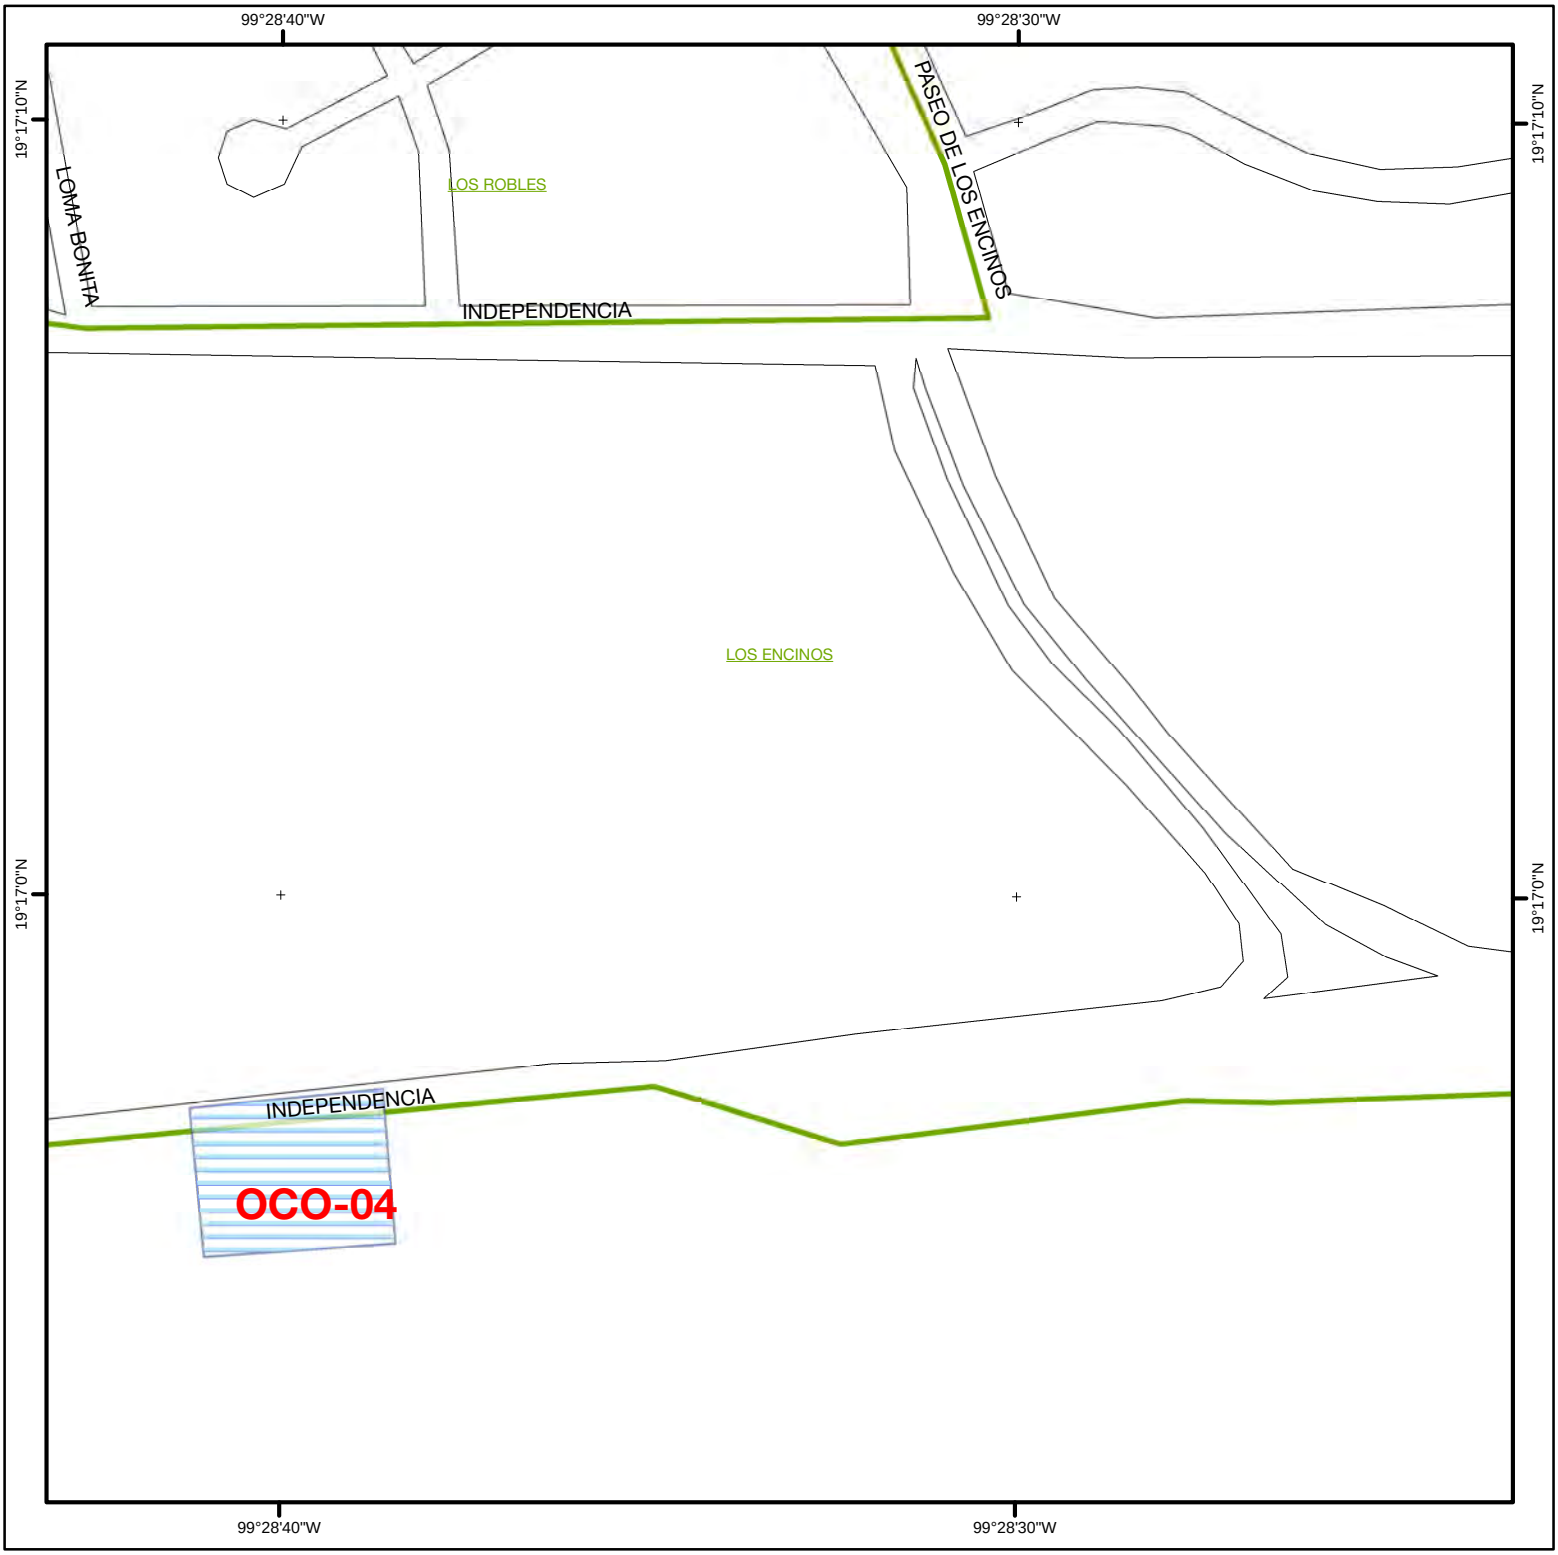

Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m^2)
OCO-04	Ench. Pluvial	0	4,621

S I M B O L O G Í A

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- Cementerio
- Escuela
- Iglesia
- Hospital
- Plaza Monumento
- Río Perenne
- Río Intermitente
- Presas y Bordos
- Inun. Urb. Fluvial
- Inun. Urb. Pluvial
- Inun. Rural Fluvial
- Inun. Rural Pluvial
- FFCC
- Ench. Fluvial
- Ench. Pluvial
- Granizada
- Deslave de Tierra
- Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN

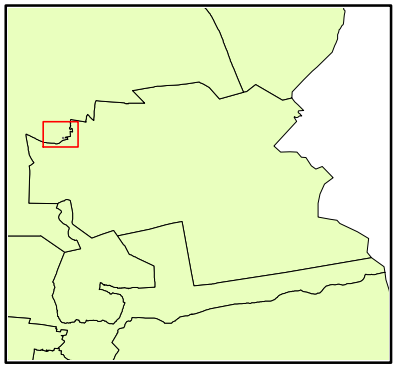

Escala Gráfica en Metros

40 20 0 40 80

Atlas de Inundaciones No. XXVI

Temporada de lluvias 2019
Río Lerma

Municipio

Ocoyoacac

Obras y Acciones

Municipio: Ocoyoacac

Obras y acciones realizadas durante el ejercicio 2019	
Operación y mantenimiento de la infraestructura existente	**Construcción de nueva infraestructura**
La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo al municipio realizó: • Limpieza y desazolve de 1,140 metros de redes de atarjeas. • Desazolve y reforzamiento de bordos de protección en diversos cauces localizados en la cuenca alta y media del rio Lerma.	

Obras y acciones programadas para el ejercicio 2020	
Operación y mantenimiento de la infraestructura existente	**Construcción de nueva infraestructura**
La Comisión del Agua del Estado de México como acción preventiva y de apoyo a los municipios, tiene programado llevar a cabo las siguientes acciones: • 1,000 metros de limpieza y desazolve de redes de atarjeas.	
